oktober 2026



Update participatieplan

Hoogspanningsstation Wijchen 380/150kV

Inhoud

1 Inleiding en proces 3
1.1 Inleiding 3
1.2 Het belang van participatie 3
1.3 Toelichting op het proces 4
1.4 Rolverdeling 5
1.5 Leeswijzer 5

2 Terugblik en huidige stand van zaken 6
2.1 Participatie en communicatie tot nu toe 6
2.2 Wat is er met de input uit de participatie tot nu toe gedaan? 7
2.3 Huidige stand van zaken 8

3 Vooruitblik participatie 9
3.1 Participatie en omgevingspartijen 9
3.2 Participatie in stap 4: planuitwerking 9
3.3 Participatie in stap 5: projectbesluit en uitvoeringsbesluiten 11
3.4 Participatie logboek 12
3.5 Overzicht van onze communicatie activiteiten en -middelen 12

4 Projecten en raakvlakken in de omgeving 14
4.1 Projecten in de omgeving 14
4.2 Overige raakvlakken 14

5 Uw reacties 16
5.1 Informatiebijeenkomst en reacties 16
5.2 Wat gebeurt er met uw inbreng? 16
5.3 Overige behoefte of vragen 16

Bijlage 1: Participatiemomenten tot nu toe 18

Bijlage 2: Overzicht belangenorganisaties in het projectgebied 22

1 Inleiding en proces

1.1 Inleiding

Om bestaande én toekomstige knelpunten in het hoogspanningsnet op te lossen, is uitbreiding van de hoogspanningsinfrastructuur noodzakelijk. Daarom gaat TenneT een nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation realiseren in de omgeving van Wijchen. TenneT is zich bewust van de impact van dit project. We proberen daarom zo transparant mogelijk te zijn bij de voorbereidingen en de uitvoering van dit project. Daarom informeren we u over de stappen die nodig zijn voor de ruimtelijke inpassing van het nieuwe hoogspanningsstation.

Voor u ligt het participatieplan voor de ontwikkeling van 380/150 kV-hoogspanningsstation Wijchen. In dit plan leest u hoe wij u informeren en betrekken bij het project. Het project is gestart met het Voornemen en voorstel voor participatie (hierna VenP). Dit VenP is in 2025 opgesteld. Hierin is toegelicht dat we bij elke nieuwe fase van het project het participatieplan actualiseren. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)[1] is een projectpagina ingericht waar het VenP te vinden is.

Dit participatieplan wordt gelijktijdig gepubliceerd met de integrale effectenanalyse (verder IEA) en het conceptvoorstel van TenneT voor de voorkeurslocatie voor het 380/150 kV-hoogspanningsstation. De volgende fase start na de publicatie van het participatieverslag en de definitieve voorkeurslocatie en duurt tot en met het projectbesluit: de planuitwerkingsfase. In dit participatieplan blikken we terug op de participatiemomenten die hebben plaatsgevonden en kijken we vooruit naar de participatie in de volgende fase van het project.

Dit participatieplan is geschreven vanuit de ‘we-vorm’. Met ‘we’ wordt bedoeld: TenneT TSO B.V. (hierna TenneT). TenneT is initiatiefnemer van dit project. De staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna KGG) van het ministerie van Economische Zaken (hierna EZK) is als coördinerend bevoegd gezag van dit project eindverantwoordelijk voor het participatieproces.

1.2 Het belang van participatie

De aanleg van een nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation heeft grote invloed op de omgeving. Zowel tijdens de aanleg als wanneer het station gebruikt wordt. Het is daarom belangrijk om zorgvuldige beslissingen te nemen en zo goed mogelijk rekening te houden met het belang van de omgeving van het project.

De projectopzet en de uitwerking van de voorkeurslocatie worden beter als inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden actief kunnen meedenken over de plannen. Daarmee kunnen we beter rekening houden met de verschillende belangen van bewoners, bedrijven en anderen in de buurt van het project. Door participatie in te zetten gebruiken we de kennis en creativiteit van de omgeving: samen weten we immers meer.

We betrekken graag alle personen en partijen van wie de belangen beïnvloed kunnen worden door het project óf die belangrijk zijn voor de ruimtelijke inpassing en vergunningverlening van het project.

[1] Het VenP kunt u vinden op de website: www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hss-wijchen
De RVO is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken.

1.3 Toelichting op het proces

Voor dit project is de projectprocedure uit afdeling 5.2 van de Omgevingswet van toepassing. Dit betekent dat we werken volgens de stappen van een projectprocedure. De projectprocedure eindigt met het nemen van het projectbesluit. Dit is stap 5 in de afbeelding hieronder. Met het projectbesluit wordt de definitieve locatie aangewezen voor het nieuwe 380/150 kV-hoogspanningsstation Wijchen. Dan is definitief waar het nieuwe hoogspanningsstation komt te staan. Daarnaast worden dan alle benodigde vergunningen voor de bouw en het gebruik van het hoogspanningsstation aangevraagd en afgegeven.

De staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna KGG) is in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) het bevoegd gezag voor het projectbesluit. In de projectprocedure naar het besluit wordt van grof naar fijn gewerkt. Dit noemen we 'trechteren'. De procedure stappen zijn hieronder geschetst in figuur 1.1.

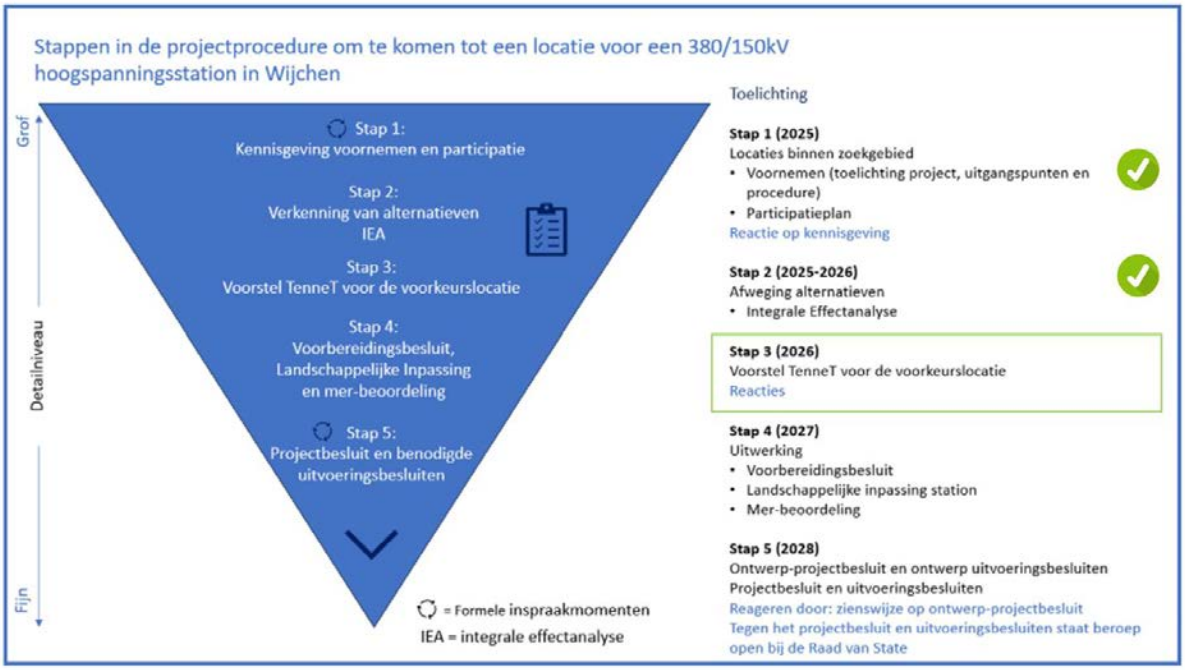

Figuur 1.1 Stappen en planning van de projectprocedure voor het hoogspanningsstation Wijchen

Stap 1, de kennisgeving VenP, is afgerond in 2025. Stap 2 en stap 3 vormen samen de verkenningsfase. De werkzaamheden in deze stappen zijn in 2026 uitgevoerd.
Het resultaat van stap 2 is de IEA. Op basis van de integrale effectenanalyse hebben we vanuit TenneT een voorstel gedaan voor een voorkeurslocatie voor het nieuwe hoogspanningsstation. Dit vormt samen het resultaat van stap 2 en 3 uit figuur 1.1. De IEA, het voorstel van TenneT voor een voorkeurslocatie en dit participatieplan liggen 6 weken ter inzage vanaf 21 oktober 2026. Eenieder die zich belanghebbend of betrokken voelt, kan bij TenneT een reactie geven op de IEA en het voorstel voor de voorkeurslocatie. Na de periode van 6 weken worden alle reacties door TenneT gebundeld en voorzien van een antwoord of reactie. Dit doet TenneT in een participatieverslag. Bij het behandelen van de reacties wordt gekeken of het een punt betreft waar nog geen rekening mee is gehouden. Er wordt een inschatting gemaakt of dit gevolgen heeft voor de onderzoeken. Als dat het geval is, dan is het een optie om de rapporten of het voorstel voor een voorkeurslocatie hierop aan te passen. We publiceren onze antwoorden op de reacties samen met het definitieve voorstel van TenneT voor een voorkeurslocatie. De uiteindelijke locatiekeuze wordt vastgelegd in het projectbesluit.

Hierna starten we stap 4, de uitwerkingsfase. In deze fase van het project voeren we detailonderzoeken uit en werken we de gekozen voorkeurslocatie verder uit. Ook bepalen we de benodigde maatregelen om effecten van het nieuwe hoogspanningsstation te beperken. We kijken dan bijvoorbeeld naar de landschappelijke inpassing.

Als de onderzoeken van voldoende kwaliteit zijn neemt de staatssecretaris van KGG een Voorbereidingsbesluit (hierna VBB). Met het VBB wordt de voorgestelde locatie tijdelijk gereserveerd, zodat er geen andere plannen voor deze locatie kunnen worden gemaakt. Met dit VBB wordt de ruimte uit voorzorg gereserveerd. Het is nog geen definitieve locatiekeuze. De definitieve keuze voor een locatie wordt pas gemaakt bij het nemen van het projectbesluit (stap 5 in figuur 1.1.).

Voor de definitieve voorkeurslocatie stellen we vanuit TenneT een mer-beoordelingsnotitie op met de milieueffecten op en rond de voorziene locatie. De staatssecretaris van KGG beoordeelt deze mer-beoordelingsnotitie. Daarna besluit de staatssecretaris van KGG of er een Milieueffectrapportage (hierna MER) moet worden opgesteld, of dat dit niet nodig is. Een MER is een uitgebreid diepgaand onderzoek naar milieueffecten. KGG neemt deze beslissing in een mer-beoordelingsbesluit. Als uit het besluit van de staatssecretaris volgt dat een MER moet worden opgesteld, dan zullen we dit eerst doen voor de procedure verder gaat. Het VBB en het mer-beoordelingsbesluit worden los van elkaar gepubliceerd. Er is hierop geen afzonderlijke inspraak mogelijk. Inspraak is hierna weer mogelijk in stap 5, bij het ontwerp projectbesluit.

In stap 5 wordt eerst het ontwerp-projectbesluit opgesteld en gepubliceerd. Hierop is inspraak mogelijk. Ook in deze stap zullen de binnengekomen reacties worden beantwoord. Samen met de antwoorden op de reacties wordt het definitieve projectbesluit gepubliceerd. In het projectbesluit staat onder andere de exacte ligging van de locatie van het nieuwe hoogspanningsstation, de resultaten van de onderzoeken en de ruimtelijke en juridische maatregelen voor de realisatie.

1.4 Rolverdeling

TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Als netbeheerder zijn wij de initiatiefnemer voor het nieuwe hoogspanningsstation. Via het landelijke net transporteert TenneT elektriciteit via kabels, lijnen en hoogspanningsstations naar de netten van de regionale netbeheerders (zoals Alliander). Zij zorgen er op hun beurt voor dat de elektriciteit bij de gebruikers terechtkomt. Ingenieursbureau Sweco ondersteunt TenneT bij het uitvoeren van dit project.

De staatssecretaris van KGG en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierna VRO) zijn samen het bevoegd gezag. Dat betekent dat zij uiteindelijk besluiten waar het hoogspanningsstation komt te staan. De staatssecretaris van KGG is ook het coördinerend bevoegd gezag voor de vergunningen. De vergunningen gaan samen met het projectbesluit in procedure. Over de te nemen besluiten laten de staatssecretaris en minister zich adviseren door de regionale overheden. Voor dit project zijn dat de gemeente Wijchen, de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 geven we een terugblik op de participatie tot nu toe en beschrijven we de stand van zaken. In hoofdstuk 3 gaan we in op de participatie in de komende fase. In hoofdstuk 4 geven we aan hoe u kunt reageren. Tot slot vindt u in bijlage 1 het participatielogboek, waarin we terugblikken op het participatieproces tot nu toe. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van belanghebbende stakeholders die bij ons in beeld zijn.

2 Terugblik en huidige stand van zaken

2.1 Participatie en communicatie tot nu toe

In het VenP is aangegeven welke locaties voor de realisatie van het 380/150 kV-hoogspanningsstation TenneT van plan was verder te onderzoeken in de projectprocedure. In de zomer van 2025 is het VenP gepubliceerd en heeft deze 6 weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden hierop reageren. Daarnaast heeft communicatie plaatsgevonden via informatiebijeenkomsten, brieven en persoonlijke gesprekken. Hieronder beschrijven we beknopt welke communicatie heeft plaatsgevonden naast de formele publicatie en ter inzage legging. In bijlage 1 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Reacties op V&P
In totaal zijn er 33 reacties op het VenP ingediend. Hiervan waren zeven reacties van organisaties: gemeente Wijchen, provincie Gelderland, leefbaarheidsgroepen, vereniging Windpark Wijchen en ZLTO. Individuele reacties zijn gekomen uit de kern van Wijchen (zeven stuks), van binnen het zoekgebied voor een stationslocatie (tien stuks) en van buiten het zoekgebied (negen stuks).

Informatiebijeenkomsten
In 2025 zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest. Hierbij waren onder andere TenneT, het ministerie, RVO, de gemeente en provincie aanwezig.

- Op 25 juni 2025 was er een middag- en avondbijeenkomst in de periode dat het VenP ter inzage lag.
- Op 3 december 2025 was er een informatiebijeenkomst over de Opwaardering van de verbinding Dodewaard-Boxmeer, georganiseerd door het projectteam van dat project. Bij deze bijeenkomst is er ook informatie over het nieuwe hoogspanningsstation in Wijchen gedeeld.

Gesprekken met bewoners/grondeigenaren/belanghebbenden
Naast de inspraak en informatie bijeenkomsten hebben we gecommuniceerd via brieven en persoonlijke gesprekken met grondeigenaren en mensen met een direct belang, zoals bewoners. Op deze manier hebben wij hen persoonlijk geïnformeerd en ontvingen zij persoonlijk uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten. Op deze manier hebben we het project specifiek bij grondeigenaren en direct belanghebbenden onder de aandacht gebracht. Daarnaast hebben we gesproken met leefbaarheidsgroep Batenburg en Natuur Wijchen en een windondernemer. Tijdens deze gesprekken zijn ook zorgen, aandachtspunten en voorkeuren benoemd. Deze zijn meegenomen in de onderzoeken en de IEA.

Daarnaast is er in november 2025 een aparte bijeenkomst geweest met de grondeigenaren en direct aanwonenden over het toevoegen van een locatie (nr 4) aan de onderzoeken. Deze bijeenkomst is in samenspraak georganiseerd naar aanleiding van de inspraak. Bij deze bijeenkomst waren 9 bewoners en grondeigenaren aanwezig.

Overleggen met overheden

Er is geregeld ambtelijke en bestuurlijke overleg geweest met de gemeente Wijchen, provincie Gelderland en waterschap Rivierenland op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Daarin zijn zowel inhoud, aanpak, als proces en betrokkenheid van de omgeving met elkaar besproken. De gemeenteraad is medio 2025 eveneens geïnformeerd. Bij dit moment waren we vanuit TenneT aanwezig. Daarnaast waren ook ministerie van EZK, ZLTO en bewoners aanwezig.

Overige communicatie:
Tijdens informatiebijeenkomsten kon men zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Er zijn tot op heden 3 nieuwsbrieven verstuurd aan de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Daarnaast is

er voor het project een eigen projectpagina op de website van TenneT[2] waarop de stand van zaken van het project staat beschreven. Daarnaast is er ook een projectpagina op de website van de RVO[3]. Hier zijn ook de gepubliceerde stukken van het project te vinden.

2.2 Wat is er met de input uit de participatie tot nu toe gedaan?

Voordat het VenP werd gepubliceerd in juni 2025, hebben we een voorverkenning uitgevoerd. Tijdens de voorverkenning hebben we een globaal zoekgebied vastgesteld. Binnen dit zoekgebied hebben we gezocht naar mogelijke plekken waar het nieuwe hoogspanningsstation en de aansluiting op het bestaande hoogspanningsnet het best gerealiseerd zou kunnen worden. Uit deze voorverkenning zijn binnen het zoekgebied drie locaties naar voren gekomen. Locatie 1 bestaat daarbij uit twee varianten (A en B).

In de reacties op het VenP zijn vijf aanvullende locatievoorstellen aangedragen. Twee daarvan, locatie 2B en locatie 4, zijn meegenomen in de verdere verkenning en de IEA.

In de reactienota VenP hebben we beschreven waarom de andere aangedragen locaties niet verder zijn onderzocht. Figuur 2.1 laat alle onderzochte locaties zien inclusief bestaande, te vervallen en nieuwe hoogspanningsverbindingen. De nieuwe hoogspanningsverbindingen (blauw in figuur 2.1) zijn nodig om het nieuwe 380/150 kV-hoogspanningsstation onderdeel te laten uitmaken van het hoogspanningsnet. Hierdoor zal een deel van de bestaande verbinding (de roze lijn in figuur 2.1) vervallen.

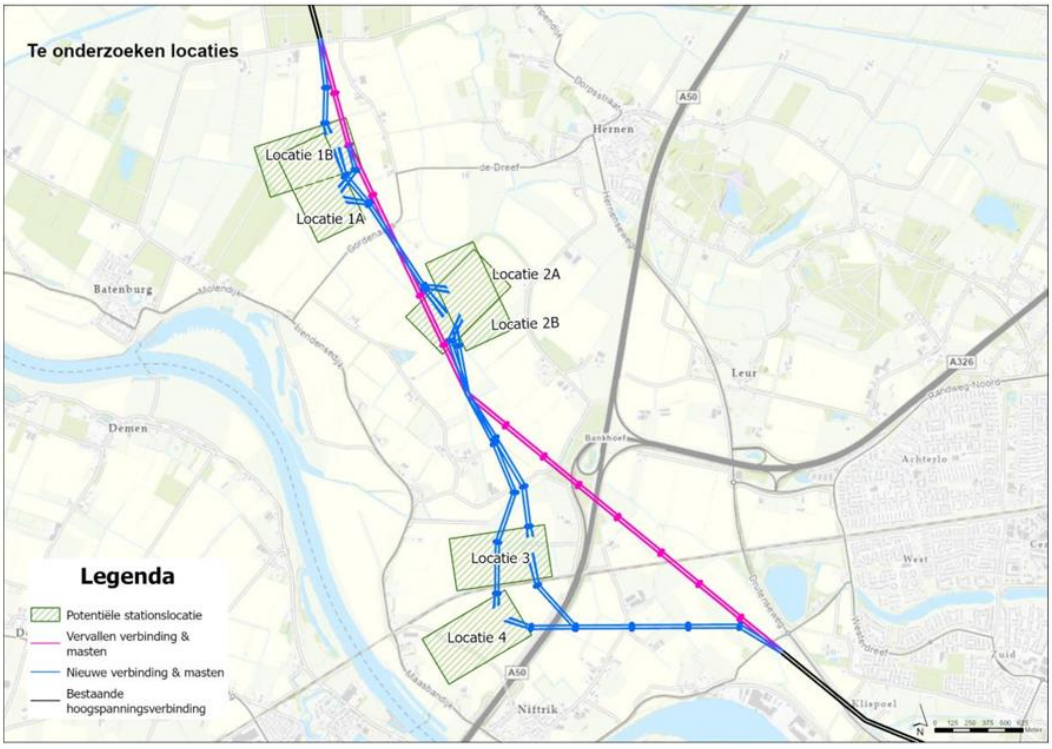

Figuur 2.1: De onderzochte locaties

In de reacties op het VenP zijn tot slot zorgen geuit over de thema's waarin in het IEA onderzoek naar is gedaan. In reacties op het VenP gaven indieners aan welke locaties volgens hen meer of minder geschikt waren. De integrale beoordeling van de effecten van de locaties vond plaats in de IEA. Een beoordeling van locaties was toen echter nog niet aan de orde. Daarnaast hebben we naar aanleiding van verzoeken in de reacties visualisaties laten maken en geplaatst op de projectviewer. De

[2] Projectwebsite TenneT: www.tennet.eu/wijchen380kv
[3] Website RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hss-wijchen

projectviewer is te vinden op de projectwebsite van TenneT. Er is verzocht om grondeigenaren en bewoners apart te benaderen/te betrekken van overige belanghebbenden. Hieraan is invulling gegeven, zie ook paragraaf 2.2 en bijlage 1.

2.3 Huidige stand van zaken

De afgelopen periode (2026) stond in het teken van het opstellen van de IEA en het conceptvoorstel voor de voorkeurslocatie van TenneT. In de IEA is onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven of varianten zodat per locatie de effecten inzichtelijk worden gemaakt op de relevante thema's. De locaties zijn in de IEA onderzocht op de volgende thema's:

- Milieu;
- Omgeving;
- Techniek en toekomstvastheid;
- Kosten.

De IEA vormt de basis voor de locatieafweging in het conceptvoorstel voor een voorkeurslocatie. Dit is in een apart document opgenomen (conceptvoorstel Voorkeurslocatie hoogspanningsstation Wijchen).

In het gebiedsproces hebben gemeente Wijchen, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en andere betrokken gebiedspartijen gezamenlijk gekeken naar de gebiedskenmerken, ontwikkelopgaven en aandachtspunten rond de onderzochte locaties. De opbrengsten van dit proces zijn benut om de locaties aanvullend te beoordelen op aspecten zoals leefbaarheid, landbouw, natuur, water en landschappelijke kwaliteit. Deze inzichten zijn vervolgens als kwalitatieve input betrokken bij de integrale afweging in het conceptvoorstel voor een voorkeurslocatie.

Dit participatieplan ligt gelijktijdig met de IEA en het conceptvoorstel voor voorkeurslocatie ter inzage van 21 oktober tot en met 2 december 2026. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe u reactie kunt geven op de stukken. Op 29 oktober 2026 houden we een informatiemiddag en een informatieavond in De Zandloper in Bergharen.

Nadat het conceptvoorstel van TenneT met de omgeving (overheden, bedrijven, bewoners) door middel van terinzagelegging is besproken, kan een definitief voorstel worden gemaakt. Op basis van de reacties werkt TenneT toe naar een definitief voorstel voor een voorkeurslocatie. Dit voorstel wordt aangeboden aan het ministerie van EZK voor verdere besluitvorming en het projectbesluit.

3 Vooruitblik participatie

3.1 Participatie en omgevingspartijen

Zoals eerder aangegeven wordt de verkenningsfase afgesloten met het publiceren van de IEA en het concept en definitieve voorstel van TenneT voor een voorkeurslocatie met het participatieverslag. Deze voorkeurslocatie wordt uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. Dit zijn stap 4 en stap 5 in het processchema zoals opgenomen in hoofdstuk 1 (figuur 1.1).

TenneT en het ministerie van EZK onderscheiden in dit project de komende fase de volgende vier omgevingspartijen:

- Bewoners: bewoners in of rondom of met zicht op de voorkeurslocatie ;
- Bedrijven: bedrijven gevestigd in of rondom de voorkeurslocatie of met een belangrijk aandeel in of bij de locatie;
- Maatschappelijke organisaties: organisaties, die een maatschappelijk belang hebben, zoals bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties;
- Bestuursorganen: betrokken bestuursorganen op zowel landelijk niveau (het ministerie), regionaal niveau (de provincie en het waterschap) als lokaal niveau (de gemeente).

In bijlage 2 is de inventarisatie opgenomen van de bij ons al bekende stakeholders. De wijze en het doel van participatie verschillen per stakeholdergroep en projectfase. De wijze waarop wij deze groepen stakeholders informeren en waar passend betrekken, is in onderstaande paragrafen beschreven.

3.2 Participatie in stap 4: planuitwerking

In deze fase richten de participatieactiviteiten zich primair op bewoners, grondeigenaren, bedrijven en belangenorganisaties in en rondom de voorgestelde voorkeurslocatie.

In stap 4 wordt het nieuwe hoogspanningsstation verder uitgewerkt en wordt gewerkt aan de inpassing van het hoogspanningsstation. Het gaat hierbij om uitwerking op het gebied van watercompensatie, mogelijke natuurcompensatie en landschappelijke inpassing. Hiervoor organiseren we een aantal ontwerpsessies met zowel de betrokken overheden als de bewoners, bedrijven en overige belanghebbenden. Daarnaast starten we onder coördinatie van het ministerie van EZK de vergunningenprocedures op.

Doel van participatie in deze stap:

- De omgeving actief laten bijdragen aan het plan voor landschappelijke inpassing (het Landschapsplan). Zo creëren we een landschapsplan met zoveel mogelijk draagvlak;
- Het goed doorlopen van de vergunningprocedures zoals Omgevingsplan activiteit bouwen, watervergunning, omgevingsvergunning flora en fauna en mogelijk N2000 activiteit;
- Wensen, belangen en relevante informatie van bewoners en grondeigenaren bij de voorgestelde voorkeurslocatie kennen.

Daarnaast gaan we in gesprek met grondeigenaren over betredingstoestemmingen voor veldonderzoeken en informeren we grondeigenaren over de verwervingsprocedure. Wanneer we een definitieve voorkeurslocatie voorstellen aan het ministerie van EZK worden de gesprekken over de minnelijke verwerving door ons opgestart.
Over de definitieve voorkeurslocatie gaan we ook in gesprek met de bewoners die zicht hebben op de locatie. Dat doen we via individuele gesprekken of met een bijeenkomst.

Naast bij de participatiemomenten ziet u de komende fase van het project mogelijk ook op andere momenten projectleden in het gebied. In 2027 worden verschillende veldonderzoeken in het

plangebied ingepland en uitgevoerd. Het gaat onder andere om archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, onderzoek naar zettingsgevoeligheid en bodemonderzoeken en niet-gesprongen explosieven. Het kan dus zijn dat u mensen in het veld ziet. We communiceren dit tijdig met de grondeigenaren en bewoners.

In onderstaande tabel geven wij inzicht in de participatiemomenten in fase 4.

Activiteit	Toelichting	Voor wie	Datum
Voorbereidingsbesluit	De staatssecretaris van KGG en het ministerie EZK neemt het voorbereidingsbesluit. Dit wordt gepubliceerd op de projectenwebsite van RVO.	Iedereen	Q2 2027
Gesprekken met grondeigenaren	TenneT gaat in gesprek met grondeigenaren. In het najaar 2026, na de publicatie van het conceptvoorstel voor de voorkeurslocatie (oktober 2026), om: • te informeren over het project; • te komen tot betredingstoestemming voor veld- en bodemonderzoeken; • verwerving van gronden voor de bouw van het hoogspanningsstation. Zodra TenneT een definitief voorstel voor een voorkeurslocatie heeft opgesteld, volgen er gesprekken over minnelijke verwerving.	Grondeigenaren op de locatie uit het conceptvoorstel voor de voorkeurslocatie	2027-2028
Mer-beoordelingsbesluit	De staatssecretaris van KGG neemt het mer-beoordelingsbesluit om te bepalen of een volledig MER nodig is. Als er geen significante milieueffecten worden verwacht, zal geen MER opgesteld worden. Het mer-beoordelingsbesluit wordt samen met het ontwerp-projectbesluit gepubliceerd.	Iedereen	Q1 2028
Regio-overleggen en bestuurlijke overleggen	TenneT en EZK spreken regelmatig met ambtenaren en bestuurders over de voortgang van het project. Specifiek over landschappelijke inpassing en de vergunningprocedures voorzien we in elk geval: - begin 2027 om beschikbare informatie aan te vullen, kaders te bepalen (uitgangspunten en randvoorwaarden) met mogelijk een eerste beeld voor inpassing. - eind Q1 2027 naar aanleiding van de 1e ontwerpsessie met de omgeving. - eind Q2 naar aanleiding van de 2e ontwerpsessie met de omgeving. -begin Q3: ambtelijk en bestuurlijk overleg over het eindresultaat voor de landschappelijke inpassing. Met het waterschap voorzien we gesprekken over de omvang van watercompensatie.	Gemeente Wijchen, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland	2027
Gesprekken met belanghebbenden over de locatie en de landschappelijke inpassing	TenneT praat in een drietal zogenaamde ‘ateliersessies’ met direct betrokkenen van het voorgestelde hoogspanningsstation, zoals directe omwonenden, bedrijven in de directe omgeving en belangenorganisaties, over de landschappelijke	Bewoners, bedrijven, grondeigenaren en belangenorganisaties	Q1, Q2 en Q3 2027

	inpassingsmaatregelen van het hoogspanningsstation. Daarbij hebben we voor ogen: Sessie 1: medio Q1 inbreng op eerste landschappelijke schets op basis van de reeds opgehaalde informatie en inzichten en deze aanvullen en ontvangen reacties op de eerste schets Sessie 2: medio Q2 reacties/input ophalen op de 2e landschappelijke schets op basis van input van sessie 1 Sessie 3: eind Q3 presentatie van het eindresultaat		
Afstemming vergunningaanvragen	Gemeente, provincie en waterschap worden betrokken bij de voorbereiding van vergunningaanvragen en ontwerpvergunningen	Vergunning-verleners	2027-2028

3.3 Participatie in stap 5: projectbesluit en uitvoeringsbesluiten

In deze fase neemt de staatssecretaris van KGG in overeenstemming met de minister van VRO het ontwerp-projectbesluit, waarna de omgeving hierop een zienswijze kan indienen. Dit is de laatste keer dat de omgeving formeel kan reageren op de plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation. Na deze reactieronde zal EZK definitief bepalen waar het nieuwe station komt te staan.
In deze stap worden ook de vergunningaanvragen voorbereid en overlegd met de bevoegde gezagen. Dit zijn de gemeente Wijchen, provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland.

Doel participatie in deze stap:

Het voorgenomen projectbesluit bekend maken in de omgeving en reacties uit de omgeving verzamelen op het voorgenomen projectbesluit en de ontwerpvergunningen.

In onderstaande tabel geven wij inzicht in de participatiemomenten in fase 5.

Activiteit	Toelichting	Voor wie	Datum
Regio-overleggen en bestuurlijke overleggen	TenneT en EZK spreken met regionale ambtenaren en bestuurders over: -mer aanmeldingsnotitie en beoordelingsbesluit : Q1 2028 -(ontwerp)projectbesluit en vergunningen: Q4 2027 en Q2/Q3 2028 -concept definitieve besluiten: eind 2028 Met de bevoegde gezagen zullen de vergunningaanvragen worden voorbereid	Gemeente Wijchen, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland	2027-2028

Ter inzage legging ontwerp-projectbesluit	Mogelijkheid om gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen op het ontwerp-projectbesluit. De bewindspersonen gebruiken deze zienswijzen voor het definitief vaststellen van het projectbesluit. Ter inzage legging van het ontwerp-projectbesluit is vooralsnog voorzien medio 2028	Iedereen	medio 2028
Informatiebijeenkomst	Tijdens de inzageperiode van het ontwerp-projectbesluit zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Hier kan iedereen vragen stellen en is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-projectbesluit.	Iedereen	Q2/Q3 2028
Publicatie definitief besluit door EZK incl. reacties op ontwerp-projectbesluit en vergunningen	De ministers publiceren het definitieve projectbesluit in de Staatscourant, op de projectwebsite en in lokale media.	Iedereen	Q4 2028
Beroepsmogelijkheid bij RvS	Het is mogelijk om tegen het projectbesluit in beroep te gaan bij de Raad van State.	Iedereen	Naar verwachting Q4 '28/Q1 2029

3.4 Participatielogboek

Alle participatie-activiteiten in dit project verzamelen we in een logboek. Hierin leest u welke activiteiten wanneer zijn geweest, wie hierbij aanwezig waren en wat de belangrijkste onderwerpen van de activiteit waren. Het participatielogboek voegen we toe aan de besluiten die in de toekomst ter inzage worden gelegd.

3.5 Overzicht van onze communicatie activiteiten en -middelen

In de planuitwerkingsfase verschuift het accent van algemene projectcommunicatie naar direct contact met grondeigenaren, omwonenden en andere direct betrokkenen rondom de voorgestelde voorkeurslocatie.

In de uitwerkingsfase houden wij u via verschillende communicatiemiddelen en activiteiten op de hoogte over het project. Onderstaand laten we zien hoe wij de communicatie voor ons zien tot en met de publicatie van het projectbesluit. Deze communicatiemiddelen zijn niet de enige manieren van communicatie. Naar behoefte kunnen we per situatie verschillende middelen inzetten zoals bijvoorbeeld individuele gesprekken.

• Via direct contact:
Omgevingspartijen met wie we al in contact zijn informeren we geregeld over de stappen en voortgang van het project. Dat doen we zeker in gesprekken met de grondeigenaren en met de bewoners die zicht hebben op de locatie waarvoor TenneT een definitief voorstel voor de voorkeurslocatie heeft gedaan. We hebben dat in paragraaf 3.2 en 3.3 ook benoemd. We informeren hen over de definitieve voorkeurslocatie en blijven met hen regelmatig in gesprek over de voortgang. We staan ook open voor gesprekken op verzoek van bewoners, grondeigenaren en belangenorganisaties. U kunt ons daarvoor benaderen.

• Via informatiebijeenkomsten:
Tijdens elke belangrijke stap in het project en tijdens elke ter inzagelegging, zullen we een informatiebijeenkomst organiseren. U kunt hierbij denken aan een informatieavond in een gemeentehuis of buurthuis. Dat doen we nu bij de publicatie van de IEA en het voorstel voor de voorkeurslocatie en voor de formele procedure stap bij het ontwerp-projectbesluit (zie ook paragraaf 3.2 en 3.3). Voor het opstellen van het landschapsplan organiseren we separate sessies voor de bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden, zoals ook aangegeven in paragraaf 3.2.

• Nieuwsbrieven (digitaal):
We stellen regelmatig digitale nieuwsbrieven op. Deze zullen we in de komende periode koppelen aan bijeenkomsten die we organiseren (informatiebijeenkomsten) en sessies over de landschappelijke inrichting. Ook geven we in de nieuwsbrief aandacht aan het participatieverslag naar aanleiding van de reacties op de IEA en het conceptvoorstel voorkeurslocatie en over de resultaten van onderzoeken. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website van TenneT[4].

• Via publicaties in media:
− Publicatie van formele besluiten door de staatssecretaris van KGG in de Staatscourant zoals het VBB, milieubeoordelingsbesluit en het (ontwerp) projectbesluit.
− Publicatie van belangrijke stappen in het project in diverse lokale en regionale media. Naast de formele besluiten zijn dat informatie over de definitieve voorkeurslocatie van TenneT en informatiebijeenkomsten die we organiseren.
− We maken als dat kan ook gebruik van communicatiemiddelen van derden, zoals gemeentepagina's in huis-aan-huisbladen en websites en social media van de gemeente Wijchen, provincie Gelderland en belangenorganisaties zoals de LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) en natuur- en milieufederaties.

• Via internet:
− Op de website www.rvo.nl/hss-wijchen vindt u informatie over de procedure en het besluitvormingsproces. Ook vindt u hier de documenten die gepubliceerd worden. Denk hierbij aan ontwerpbesluiten, reactienota, milieueffectrapport-beoordeling, updates van de participatieplannen etc.
− Overige informatie over het project delen we via de website: www.tennet.eu/wijchen380k. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsberichtenservice. U ontvangt dan een e-mail wanneer er een nieuw bericht is geplaatst. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook vindt u hier het participatieverslag van TenneT.

− Op de TenneT-website van het project staat een kaart met het zoekgebied en de zoeklocaties. Dit noemen we de projectviewer. In de projectviewer kunt u reageren op het project, vragen stellen, zorgen of suggesties delen en reacties van anderen bekijken. De viewer passen we aan als er een definitieve keuze is voor de voorkeurslocatie.
− In animatiefilmpjes en overzichtsplaatjes op de TenneT-website geven we uitleg over het nieuwe hoogspanningsstation: wat houdt deze in, waarom is het nieuwe station nodig en hoe ziet de procedure eruit.

[4] Projectwebsite TenneT: https://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/gelderland/380-kv-hoogspanningsstation-bij-wijchen

4 Projecten en raakvlakken in de omgeving

Het project staat niet op zichzelf, maar hangt samen met andere projecten die TenneT uitvoert voor de versterking van het hoogspanningsnet in de regio. We proberen daarom het informeren van belanghebbenden van deze projecten zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De uitwerking en besluitvorming van de projecten stemmen we zoveel mogelijk op elkaar af. Ook worden uitvoeringswerkzaamheden van de verschillende projecten op elkaar afgestemd. Het kan namelijk zo zijn dat werkzaamheden van een bepaald project afgerond moeten zijn voordat gestart kan worden met de werkzaamheden van het volgende project.

4.1 Projecten in de omgeving

Andere projecten van TenneT in de omgeving zijn onder andere:

150 kV-verbinding van 380/150 kV-hoogspanningsstation Wijchen naar Oss
Het nieuwe 380/150 kV-hoogspanningsstation zal met een ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabel worden verbonden met het 150 kV-netwerk in Oss. De aanleg van deze kabel is een apart project en maakt geen onderdeel uit van de planfase van 380/150 kV-hoogspanningsstation Wijchen.

Verzwaring bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Dodewaard
De capaciteit van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding ten zuidwesten van Wijchen wordt uitgebreid. TenneT doet dit door de bestaande geleiders te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. De start van de werkzaamheden is op dit moment voorzien voor 2028.

Uitbreiding 380/150 kV-hoogspanningsstation Dodewaard
Het bestaande 380/150 kV-hoogspanningsstation bij Dodewaard wordt uitgebreid om ruimte te maken voor meer aansluitingen. Daarnaast worden, vooruitlopend op de uitbreiding, nieuwe transformatoren op het bestaande station geplaatst.

380kV/150kV-hoogspanningsstation Rivierenland
In de Betuwe wordt gezocht naar ruimte voor een nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation, een bovengrondse hoogspanningsverbinding naar dit station en meerdere 150 kV-hoogspanningsstations met ondergrondse verbindingen. TenneT en het ministerie van EZK zijn momenteel bezig met het voorbereiden van de start van de projectprocedure voor dit project.

Diepe aanlandingen voor windenergie op zee
Voor de aansluiting van op de Noordzee opgewekte windenergie op het hoogspanningsnet, komen in de toekomst mogelijk één of meerdere converterstations in Nederland te staan. Het ministerie EZK is een voorverkenning gestart naar mogelijke locaties voor converterstations voor zogenaamde diepe aanlandingen van windenergie in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Deze voorverkenning bevindt zich nog in de beginfase van planvorming. De eerste resultaten worden in Q1 2027 verwacht. Het ministerie EZK onderzoekt daarnaast ook aansluitlocaties in de kustprovincies.

4.2 Overige raakvlakken

Het project hangt samen met de volgende, andere nationale en regionale energie programma’s en projecten:

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)
In het programma MIEK werkt de Rijksoverheid samen met bedrijven, medeoverheden, netbeheerders en kennisinstituten aan het toekomstig energiesysteem. Daarbij is het MIEK een instrument om sneller en efficiënter tot een compleet en goed werkend

energiesysteem te komen. Projecten met een MIEK-status worden door het programma geholpen om verder vooruit te plannen, beter te prioriteren en problemen en knelpunten op te lossen. Het project 380/150 kV-hoogspanningsstation Wijchen is opgenomen in het nationale MIEK.

Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN)
In het LAN werken verschillende partijen onder regie van de minister van Klimaat en Groene Groei samen aan een gemeenschappelijk doel: zorgen voor toegang tot elektriciteit. Eén van de actielijnen is het sneller bouwen van elektriciteitsinfrastructuur zoals dit project.

Verbreding A50
Verbreding van de A50 naar 2x3 rijstroken tussen knooppunt Bankhoef en Paalgraven is opgenomen in het MIRT. Langs de A50 dient rekening gehouden te worden met een strook voor deze verbreding die niet beschikbaar zal zijn voor een eventueel station. Het project is door het ministerie I&W stilgelegd in verband met bezuinigingen.

Regionale energiestrategie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
In de regionale energiestrategieën (RES) werken 30 regio's in Nederland aan het opwekken van hernieuwbare energie op land. Ook voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, waar het zoekgebied van hoogspanningsstation Wijchen binnen valt, is een RES opgesteld. Hierin staat waar in deze regio gezocht wordt naar duurzame warmtebronnen (zoals windmolens en zonneparken) als alternatief voor het aardgas waarmee huizen en gebouwen verwarmd worden.

Visie Zon & Wind gemeente Wijchen
In deze visie geeft de gemeente Wijchen aan waar en hoe zij windmolens en zonneparken op het grondgebied van de gemeente wil plaatsen. Voor windmolens zijn nog drie mogelijke gebieden over: bij Batenburg, tussen de A50 en de Wezelse Plas en ten westen van de A50 bij Niftrik. Deze gebieden liggen deels in het zoekgebied voor het nieuwe hoogspanningsstation Wijchen. Bij het kiezen van een locatie voor het hoogspanningsstation zal rekening gehouden worden met de Visie Zon & Wind van de gemeente Wijchen. De gemeente heeft aangegeven dat de positionering van een hoogspanningsstation voorrang heeft op de realisatie van windmolens.

De Brabantse Aanpak Netcongestie(BAN)
In Noord-Brabant is netcongestie een groot probleem. Het doel van de BAN is het beperken van de impact van netcongestie op korte en middellange termijn, zodat Brabant kan blijven ontwikkelen, én tegelijk toewerken naar een robuust en toekomstbestendig energiesysteem richting 2050. Er is een samenhangend en adaptief pakket van maatregelen ontwikkeld. Dit pakket is gericht op meer inzicht in netbelasting, het vergroten van de capaciteit van het huidige elektriciteitsnetwerk en het slimmer gebruiken van het elektriciteitsnetwerk. Hierin wordt het station Wijchen gemonitord.

De crisisaanpak netcongestie van de Provincie Noord-Brabant
De druk op delen van het Brabantse elektriciteitsnet neemt verder toe. Daarom is gestart met een gezamenlijke crisisaanpak voor kritieke delen van het elektriciteitsnet. In dit overleg werken Rijk, Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Regionale Energiestrategieën (RES-regio's), netbeheerders en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) samen.
Binnen de crisisaanpak nemen zij maatregelen om verdere overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Snellere realisatie van kritieke netuitbreidingen is daarbij een van de maatregelen, waarbinnen ook station Wijchen wordt gemonitord.

5 Uw reacties

5.1 Informatiebijeenkomst en reacties

Dit participatieplan ligt gelijktijdig met de IEA en het conceptvoorstel voorkeurslocatie ter inzage van 21 oktober tot en met 2 december 2026.

Op 29 oktober 2026 houden we een informatiemiddag en een informatieavond in De Zandloper in Bergharen. We horen graag wat u vindt van deze documenten inclusief het participatieplan. Wat vindt u van de manier waarop u wordt betrokken bij het proces?

Iedereen die dat wil kan binnen deze termijn een reactie indienen bij TenneT. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.tennet.eu/wijchen380kv Per e-mail kan ook bij onze omgevingsmanager: gelderland@tennet.eu.

Een schriftelijke reactie per post zendt u aan:

TenneT TSO B.V.
onder vermelding van Wijchen 380 kV
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

Tijdens de informatiebijeenkomsten op 29 oktober kunt u ook mondeling een reactie indienen.

5.2 Wat gebeurt er met uw inbreng?

Alle reacties worden door TenneT in afstemming met het ministerie van EZK bekeken, beoordeeld, gebundeld en voorzien van een antwoord of reactie. Dit doen we in een participatieverslag. De reacties betrekken we bij het opstellen van het definitieve voorstel voor de voorkeurslocatie en bij het opstellen van de documenten in de uitwerkingsfase. Alle antwoorden en reacties worden anoniem gebundeld en beantwoord in een participatieverslag.

Indien u een reactie indient, ontvangt u een brief om de publicatie van het participatieverslag aan te kondigen. Mogelijk past TenneT het voorstel voor de voorkeurslocatie (deels) aan na de reacties uit de omgeving. Daarmee wordt de verkenningsfase afgerond. Daarna zal TenneT het definitieve voorstel voor de locatie verder uitwerken in de planuitwerkingsfase.

5.3 Overige behoefte of vragen

Wilt u geen reactie indienen maar heeft u een vraag?
Heeft u vragen, ideeën of oplossingen die u aan TenneT en/of het ministerie van EZK wilt meegeven?

Naast de activiteiten die wij vanuit het project voorstellen, spelen wij graag in op uw eventuele behoefte aan informatie en wijze van contact met u. Heeft u of uw organisatie behoefte aan bepaalde informatie, wilt u informatie, zorgen en/of opmerkingen met ons delen of met ons kennismaken? Laat het ons weten! Wij bekijken dan samen welke contactvorm het beste past. Dat kan een individueel contactmoment zijn, maar ook het geven van een presentatie of een werksessie.

Neem contact op met TenneT of het ministerie van EZK via onderstaande gegevens:

Voor informatie over de inhoud en participatie van het project:

- TenneT
- 0800 – 83 66 388
- www.tennet.eu/wijchen380kv
- E-mail: gelderland@tennet.eu

Voor informatie over de procedure, documenten en participatie van het project:

- Bureau Energieprojecten
- 088 042 47 47
- www.energietransitie.nl/hss-wijchen
- E-mail: bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bijlage 1: Participatiemomenten tot nu toe

Publicatie Voornemen en participatieplan
Het participatietraject is gestart met de publicatie van het VenP. Deze heeft ter inzage gelegen van 13 juni 2025 t/m 28 juli 2025. In deze periode heeft eenieder de mogelijkheid gekregen een reactie in te dienen.

De kennisgeving van het VenP is als advertentie geplaatst in de Staatscourant en in de huis-aan-huisbladen. Op dat moment zijn ook de website www.tennet.eu/wijchen380kv (met informatie over het project) en de pagina op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hss-wijchen (met informatie over de procedure en besluitvorming) online gegaan.

De publicatie is extra onder de aandacht gebracht in verschillende media. Er is onder andere een nieuwsbericht geplaatst op de gemeentepagina van Wijchen. Ook zijn er onder andere publicaties geweest in Gelderlander en RN7.

In totaal zijn er 33 reacties op het VenP ingediend. Hiervan waren zeven reacties van organisaties: gemeente Wijchen, provincie Gelderland, leefbaarheidsgroepen, vereniging Windpark Wijchen, ZLTO.

Individuele reacties zijn gekomen uit de kern van Wijchen (zeven stuks), van binnen het zoekgebied voor een stationslocatie (tien stuks) en van buiten het zoekgebied (negen stuks). N.B. Reacties van organisaties hier niet in meegenomen.

Reactie op het Voornemen en participatieplan

Ten aanzien van de stationslocaties zijn wisselende reacties binnengekomen, waardoor geen eenduidige voorkeur voor een locatie weergegeven kan worden. Er zijn voor de verschillende stationslocaties zowel positieve als negatieve reacties ontvangen. In de reacties, zowel van burgers als overheidspartijen, zijn vooral veel zorgen geuit ten aanzien van aantasting van woongenot en landschap, aantasting van historische kavelstructuren en het landbouwgebruik en -karakter van het gebied, impact op recreatie en toerisme, aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden en biodiversiteit en ecologische waarden, effecten op bodemgesteldheid en waterhuishouding, geluids- en visuele verstoring, gezondheidseffecten van magneetvelden, daling van woningwaarde/vastgoed en gevoel van onveiligheid en stress vanwege de nabijheid van grootschalige infrastructuur.
In een enkele reactie worden ook wel kansen gezien, bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling bij de landschappelijke inpassing van een hoogspanningsstation.

Diverse particuliere indieners van een reactie geven aan tegen de ontwikkeling van een hoogspanningsstation in gemeente Wijchen te zijn. Bij die reactie waarbij wordt ingegaan op de specifieke stationslocaties zijn er twaalf indieners tegen locatie 1A/1B, 7 indieners tegen locatie 2 en zes indieners tegen locatie 3. Er wordt in reacties ook soms aangegeven tegen de ene locatie te zijn, maar een andere locatie geschikter te vinden: één indiener geeft aan voor locatie 1A/1B te zijn, drie indieners zijn voor locatie 2 en vijf indieners zijn voor locatie 3. Omdat het aantal bewoners per stationslocatie verschillend is én niet iedereen een reactie indient, of niet iedereen expliciet stationslocaties in de reactie heeft aangegeven, kunnen bovenstaande reacties tegen of voor een locatie niet als een representatieve weergave worden gezien.

Bestuurlijke reacties Voornemen en participatieplan

Bestuurlijke stakeholders (gemeente Wijchen, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Provincie Gelderland) hebben aangegeven te willen zoeken naar maximale meerwaarde voor het gebied. De ruimtelijke claim voor de gemeente Wijchen en provincie Gelderland is groot, wordt gesteld, terwijl de voordelen niet voor de gemeente/provincie zijn. Er worden daarom maatregelen voor compensatie gevraagd. Er wordt aandacht gevraagd voor de bescherming van de natuur en de kernkwaliteiten in het voorgestelde zoekgebied en locatiealternatieven en er wordt gewezen op de Omgevingsverordening van Provincie Gelderland waarin niet enkel sprake is van inpassing of compensatie, maar versterking.
Ook wordt bestuurlijk aandacht gevraagd voor het behoud van landbouwstructuur en bodemkwaliteit. Zorgen van de achterban (bewoners en gebruikers van het gebied) ten aanzien van mogelijke effecten op gezondheid, dierenwelzijn, woongenot en leefomgeving zijn gedeeld. Gemeente Druten heeft ook haar zorgen geuit over leefbaarheid en woongenot en geeft ook aan dat gemeente Wijchen al een onevenredig grote (energie)last draagt.

Kansen

In een enkele reactie worden ook wel kansen gezien, bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling bij de landschappelijke inpassing van een hoogspanningsstation.

Nieuwe locatiealternatieven

Bij de reacties op het VenP is een extra, vierde, stationslocatie voorgesteld. Dit gaat om de driehoekige locatie tussen de Waal, de snelweg A50 en het spoor. Deze locatie is in het verdere onderzoek meegenomen als een volwaardige stationslocatie. Maar, omdat deze stationslocatie nog geen onderdeel uitmaakte in het VenP, is daarop door indieners van een reactie niet gereageerd.

Stationslocatie 2B is toegevoegd naar aanleiding van een reactie die bij TenneT is binnengekomen. Hierin werd het volgende aangegeven:

” Locatie 2 zou m.i. ook gedraaid kunnen worden (zie locatie 1). En dan met een ondergrondse 150 kV-verbinding de 380-kV-verbinding kruisen.”

Deze locatie is eveneens in het verdere onderzoek meegenomen als een volwaardige stationslocatie. Maar, omdat deze stationslocatie nog geen onderdeel uitmaakte in het VenP, is daarop door indieners van een reactie niet gereageerd.

Overleggen/expertsessies
Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Wijchen is door TenneT en het ministerie van EZK op 21 januari 2025 meegenomen voor een werkbezoek aan 380 kV-station Tilburg. Hiermee krijgt het college een beeld van de aard, omvang en impact van een hoogspanningsstation.

Er is een ingelaste vergadering geweest bij gemeente Wijchen voor het informeren van de gemeenteraad op 17 juni 2025. Hierbij waren TenneT, het ministerie van EZK, gemeenteraadsleden, het college van B&W, ZLTO en bewoners aanwezig.

De werkgroep Communicatie, waarin TenneT, de gemeente Wijchen, de provincie Gelderland, het ministerie EZK via RVO zijn vertegenwoordigd, is in 2025 twee keer bij elkaar gekomen, onder voorzitterschap van RVO. Op 7 april 2025 en 22 mei 2025.

Ambtelijke (AO) en bestuurlijke overleggen (BO)
Er zijn meerdere ambtelijke en bestuurlijke overleggen geweest met de gemeente Wijchen, provincie Gelderland en waterschap Rivierenland. Deze zijn hier onder weergegeven met de gespreksonderwerpen van de bijeenkomsten.

Ambtelijke overleggen:
04-11-2024: Werkatelier over bevoegd gezag, afbakening van het projectgebied, nut & noodzaak van het project (ook in aanwezigheid van gemeente Oss)
25-03-2025: In een “canvassessie” zijn de algemene kenmerken van het gebied besproken
04-04-2025: AO ter voorbereiding op het BO
23-09-2025: Terugblik op periode van ter inzage en VenP
27-10-2025: De opzet (van de onderzoeken voor) IEA en de planning.
26-01-2026: Presentatie over het gebiedsproces van de gemeente door P2, reactie nota VenP, eerste resultaten van IEA, planning en proces
03-06-2026: De definitieve resultaten van IEA, voortgang en update van het proces.
30-06-2026: Voorbereiding voor het bestuurlijke overleg op 16 juli
07-09-2026: Voorbereiding voor het bestuurlijke overleg op 18 september

Bestuurlijke overleggen:
03-04-2025: Over de procedure, publicatie VenP, participatie met de omgeving en de mogelijke locaties voor het 380/150kV, samenwerking ministerie EZK, TenneT en gemeente (digitaal)
09-05-2025: Technische briefing bestuurders
15-05-2025: Publicatie VenP
16-07-2026: Presentatie van de eerste resultaten van IEA
18-09-2026: De resultaten, vragen en opmerkingen over het concept IEA
16-10-2026: Het IEA en voorstel voor de voorkeurslocatie voor publicatie

Informatiebijeenkomsten 2025
In 2025 is er een tweetal informatiebijeenkomsten geweest. Hierbij waren onder andere TenneT, RVO, de gemeente en provincie aanwezig.

Op 25 juni 2025 was er een middag- en avondbijeenkomst georganiseerd door TenneT in de tijd dat het VenP ter inzage lag. Bij deze middagbijeenkomst zijn 40 bezoekers geweest en 's avonds waren er 52 bezoekers.

Daarnaast is er in november 2025 een aparte bijeenkomst geweest met de grondeigenaren en direct aanwonenden over het toevoegen van een locatie (nr 4) aan de onderzoeken. Deze bijeenkomst is in samenspraak georganiseerd naar aanleiding van de inspraak. Bij deze bijeenkomst waren 9 bewoners en grondeigenaren aanwezig.

Op 3 december 2025 was er een informatiebijeenkomst over de Opwaardering Dodewaard-Boxmeer, door het projectteam van dat project georganiseerd. Bij deze bijeenkomst was ook informatie over het project Wijchen 380 kV. Op deze informatiebijeenkomst zijn 105 bezoekers geweest, die kwamen voornamelijk voor de opwaardering Dodewaard-Boxmeer, maar zij hebben ook weer project Wijchen 380 kV tot zich kunnen nemen.

Informatiebrieven verstuurd door TenneT

Op 10 juni 2025 is een brief verzonden aan (20) grondeigenaren van de (toen nog) 3 zoeklocaties.

Op 17 juni 2025 is een brief verzonden aan alle bewoners in de zoekgebieden en hieromheen (222 adressen).

In september 2025 is een brief verstuurd aan de (22) woning- en grondeigenaren van het zoekgebied van de toegevoegde locatie 4.

Op 17 oktober 2025 is een informatiebrief verstuurd aan alle adressen plus aanvullende lijst (totaal 320).

Op 20 november 2025 is een informatiebrief verzonden, onder andere met uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van de opwaardering van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard (320 adressen).

Reacties bij persoonlijk contact
Naast deelname van belanghebbenden aan een van bovengenoemde activiteiten zijn er in de periode 2025/2026 door TenneT circa 30 gesprekken gevoerd met agrarische bedrijven en personen die een direct belang hebben bij het project zoals aanwonenden. Afhankelijk van hun behoefte aan informatie en contact is afgesproken hoe het projectteam van TenneT deze belanghebbenden verder over het project informeren en/of erbij betrekken. Zorgen, aandachtspunten en voorkeuren uit deze gesprekken zijn meegenomen in de omgevingsanalyse. Daarnaast is gesproken met leefbaarheidsgroep Batenburg en Natuur Wijchen en een windondernemer. Tevens is er in november 2025 een separaat overleg geweest over het toevoegen van een locatie (nr 4) aan de onderzoeken naar aanleiding van de inspraak. Hier waren 9 bewoners en grondeigenaren aanwezig.

Communicatiemiddelen (nieuwsbrief e.d.)
Tijdens informatiebijeenkomsten kon men zich inschrijven voor de nieuwsbrief. In de laatste twee informatiebrieven is een link naar de aanmelding opgenomen geweest. Het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief is per begin februari 2026: 42 aanmeldingen. Er zijn tot op heden 3 nieuwsbrieven verstuurd aan de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. (20/10/25, 14/2/26, 18/6/26).

Website/viewer
Voor het project is een eigen projectpagina op de website van TenneT: www.tennet.eu/wijchen380kv

Tussen 10 juni 2025 en 31 december 2025 zijn er 1466 bezoeken geweest op deze website. Pieken in het bezoek van de website hebben plaatsgevonden in de tweede helft juni 2025 (>150 bezoekers per week) in de periode van de ter inzage legging van het VenP. Ook was er een bezoekerspiek eind november 2025 (>120 bezoekers), na verzending van de informatiebrief over de bijeenkomst van Opwaardering Dodewaard-Boxmeer.

Op de website is de projectviewer opgenomen. Tijdens de informatiebijeenkomsten is deze veelvuldig geraadpleegd. Buiten de informatiebijeenkomsten is het bezoek van de viewer via de website beperkt (geen cijfers) gezien aantal reacties (<10).
Naar aanleiding van het bekijken van de website of de viewer zijn geen reacties ontvangen. Tevens is op de website van RVO een projectpagina ingericht:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hss-wijchen

Bijlage 2: Overzicht belangenorganisaties in het projectgebied

Dorpsraden / burgerinitiatieven /stichtingen
Leefbaarheidsgroep Batenburg
Leefbaarheidsgroep Bergharen
Leefbaarheidsgroep Niftrik
Leefbaarheidsgroep Hernen/Leur
Vereniging Windpark Wijchen A50

Netbeheerders en andere infrastructuurbedrijven
Liander Netbeheer b.v.
Gasunie
Vitens NV
ProRail

Natuur- en milieuorganisaties / Erfgoed
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Geldersch Landschap
Staatsbosbeheer
Natuur en Milieu Gelderland
IVN: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
Natuur- en Milieufederatie Gelderland
Natuur Wijchen

Brancheorganisaties
LTO Nederland
LTO Noord
ZLTO

Private energiesector
STAWAG Energie BV
Eigenaren/ beheerders kabels en leidingen

Decentrale overheden
Gemeente Wijchen
Gemeente Druten
Gemeente Oss
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Rivierenland
GGD Gelderland-Zuid
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
